


- APZĪMĒJUMI**
- proj. bruģa segums / brauktuvei un laukumam
  - proj. bruģa segums / ietvei
  - proj. eko bruģa segums
  - proj.hor.apzīmējums no bruģa
  - apzaļumošana
  - betona apmale 100.22.15 (+0cm)
  - betona apmale 100.20.08
  - demonējami objekti
  - zemes robežas
  - proj. ceļa zīmes numurs, novietojums
  - dalītā aizsargcaurule (spiedes izturība 750N)
  - aku vākuma nomaiņa
  - proj. augstumu atzīme uz seguma

- ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI**
- zemsprieguma elektr. kabelis
  - vidsprieguma elektr. kabelis
  - gāzesvads
  - apgaismes kabelis
  - ūdensvads
  - siltumtrase
  - lietus ūdens kanalizācija
  - sadzīves kanalizācija
  - sakaru kanalizācija
  - sakaru kabelis


- NOSACĪJUMI:**
- Precīza būvlaukuma atrašanās vieta Būvdarbu veicējam jāsapasako ar Pasūtītāju un zemes īpašnieku būvdarbu laikā.
  - Darba organizācijas projekta mērķi:
    - Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi.
    - Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būvniecības darbu veikšanas laikā.
    - Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.
    - Nodrošināt sanitāro higiēnas mobilo vienību uzturēšanu un sadzīves atkritumu utilizāciju.
  - Būvdarbu veicēja pienākumi:
    - Savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas.
    - Pirms darbu sākšanas veikt Pasūtītāja brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši aktuālajai likumdošanai.
    - Pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts un jāsapasako būvlaukuma atrašanās vieta normatīvos dokumentos noteiktajā kārtībā.
    - Jānodrošina zemju īpašnieku piekļuve īpašumiem būvniecības laikā.
    - Veicot būvdarbus jāievēro atbilstoši valstī noteiktie likumdošanas akti un likumi:
      - Būvniecības likums,
      - Darba aizsardzības likums,
      - Atkritumu apsaimniekošanas likums,
      - MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus",
      - MK noteikumi Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi",
      - "Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus",
      - u.c. noteikumi un būvnormatīvi, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
  - Līdz darbu uzsākšanai vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāsapasako ar ekspluatējošām organizācijām pasākumi to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.
  - Veicot ģeodēziskos darbus, nosprauzt galvenās būvīsi un nostiprināt pagaidu reperus būvlaukumā, izveidojot atbalstpunktus, no kuriem būvniecības gaita tiks veikti ģeodēziskie mērījumi, darbi jāveic saskaņā ar LBN 305-01 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā". Asu nospraušana tiek veikta, pamatojoties uz rasējumiem.
  - Visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veicēja būvlaukuma organizāciju, noņemnes iekārtošanu un iekārtām un tā visa novākšanu pēc darba pabeigšanas, kā arī citas izmaksas, kas nav aplūkotas būvdarbu organizācijas projekta sadaļā jāiekļauj tāmju darbu vienību izcenojumos. Visā būvniecības laikā nodrošināt piebraucamo ceļu uzturēšanu un remontu, būvdarbu veicējam darba apjomu paredzēt iekļaut tāmē.
  - Pie ieejas būvlaukumā, izvietot skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu - būvīfeli ar būvējamā objekta raksturojumu, būvniecības dalībniekiem, būvorganizācijas simboliku, atbildīgā darbu vadītāja uzvārdu, precīzu fas atrašanās vietu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
  - Būvlaukumā uzstādīt sanitāras iekārtas būvlaukuma personālam. Būvdarbu veicējam būvlaukumā jānodrošina piefiekams skaits piemērotu pārvietojamo bioloģisko tualetu un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Pabeidzot darbus, sanitāras iekārtas jānovāc un laukumi jāatgriež to sākotnējā stāvoklī.
  - Organizējot būvmateriālu novietnes, birstošie materiāli jānovieto atsevišķi. Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem. Mazgabariāta materiāli un instrumenti tiek uzglabāti konteinertipa noliktava.
  - Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, spēkā esošo likumdošanu, kā arī no atkritumu apsaimniekošana pieprasīt līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. Būvdarbu veicējs ir tiesīgs pieprasīt darbuizpēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuizpēmēju līgumos. Izveidot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucamas tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. Izveidot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Objektā jābūt norīkotam atbildīgajam speciālistam par darba aizsardzības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaucšanas un atjaunošanas darbus.

PRINCIPIĀLĀ BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

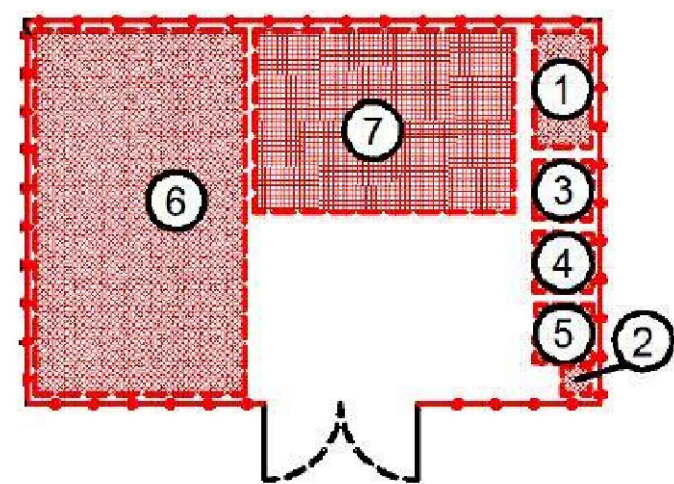

BŪVDARBU VEICĒJA MATERIĀLU UN IEKĀRTU NOVĒTNES APRĪKOJUMS:

- Pagaidu žogs "Beakaret" h=1.80m
- Pagaidu vārti (platums - 8.00m)
- 1 Būvdarbu veicēja pārvietojamais vagoniņš
- 2 Biotualete
- 3 Sadzīves atkritumu tvertne
- 4 Būvgružu konteiners
- 5 Ugunsdrošības stends ar smilšu kasti un pirmās palīdzības komplekts
- 6 Būvmateriālu krautne
- 7 Būvmašīnu un iekārtu novietne

<div><div>SIA "NeoForm" Daugavpils, Varšavas 20-1 Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div></div>		<div><div>PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”. Juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417</div><div>OBJEKTS: Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošana ar esošo asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu</div></div>		<div><div>IEPIRKUMS: Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU-2022/005P „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošo asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūvei”</div></div>	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	
Būvpr.vad.	S.Gorņiks		05.2022.	Būvdarbu ģenerālplāns	
Būvpr.d.vad.	S.Gorņiks		05.2022.		
Projektēja	D.Gavilovskis		05.2022.		
				Līguma Nr.	2022/005P
				Arhīva Nr.	2022/005P
				Mērogs:	1:250
				Stadija	Lapas
				Būvniecības ieceres dokumentācija	-
					Ras.Nr.
					DOP-1
