


Objekta novietojuma shēma


Daugavas iela 24, Daugavpils
Kad.Nr.0500-001-5902



Ēku eksplikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Piezīmes
	Zemes kadastra kad.num. 05000015902	zemes koplāpība 952,0m ²
1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	galvenais iedzīvošanas veids - 11/201
2.	Esošā ēka	


SITUĀCIJAS PLĀNS

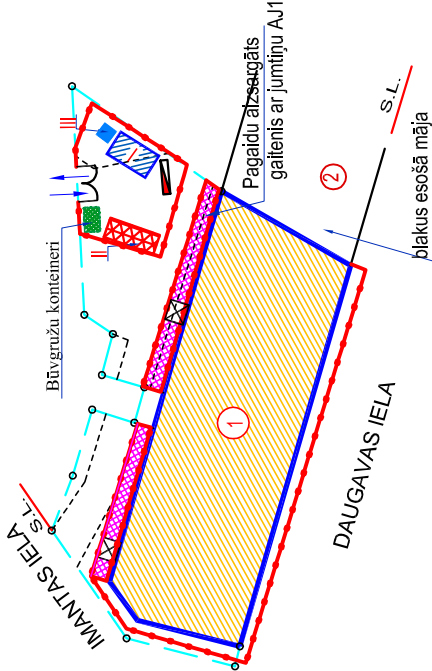


Pagaidu ēku un būvju eksplikācija

Nr p/k	Nosaukums	Mērvērtība	Daudz
I	Pārveidojamo pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta	m ²	13.10
II	Materiālu nokraušanas vieta	m ²	7.18
III	Biotuālele	m ²	1.68
IV	Pagaidu nožogojums	m	~125.00



AIZSARDZĪBAS JUMTIŅA AJ (6 gp)
KONSTRUKCIJA
M 1:50

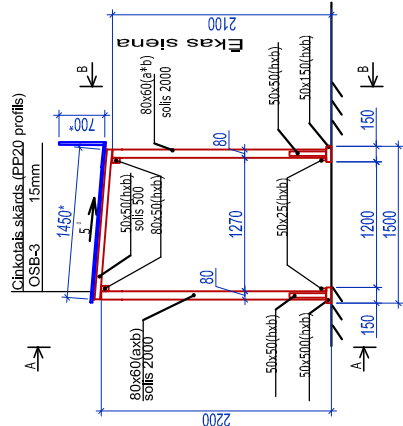


GREIZUMS "A-A"
M 1:50

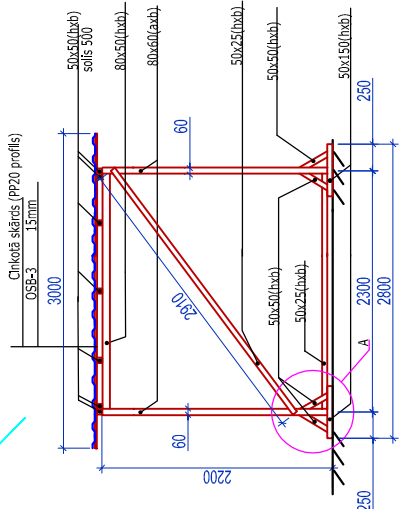


GREIZUMS "B-B"
M 1:50

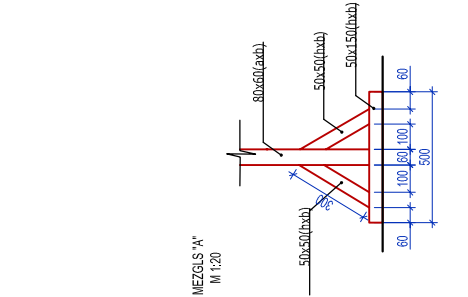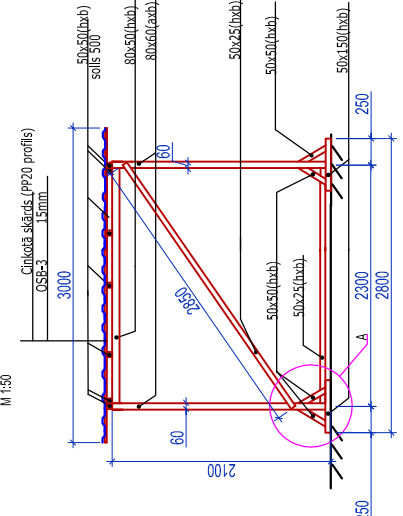


GAJEJU AIZSARDZĪBAS JUMTIŅŠ AJ1 (-25m)
(PROTINA SKATĪS)
M 1:50

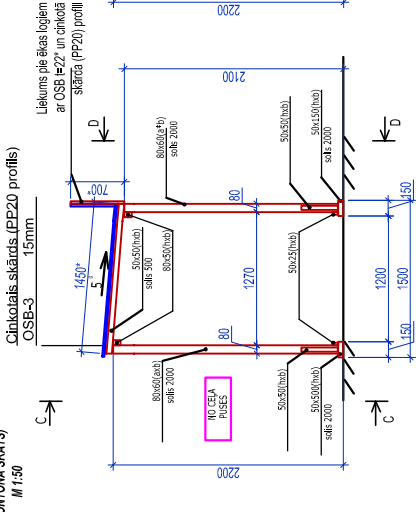

GREIZUMS "C-C"
M 1:50

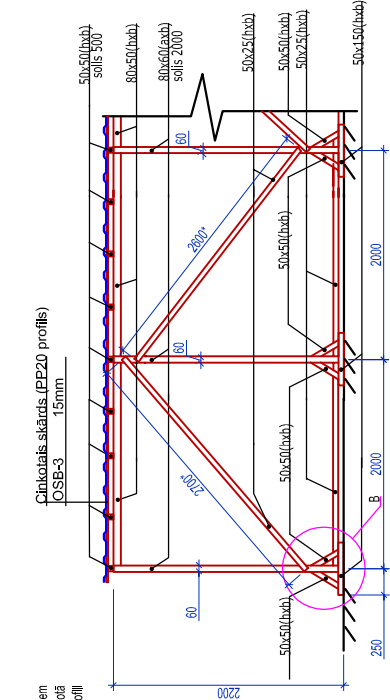

GREIZUMS "D-D"
M 1:50

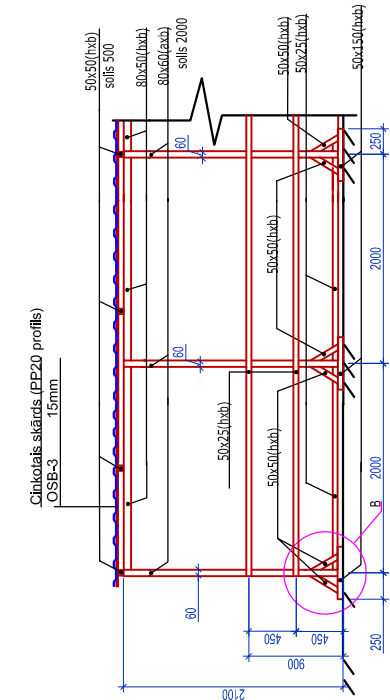

DARBA AIZSARDZĪBAS INVENTĀRA STENDA SHĒMA
M 1:50



- Aizsardzības jumtīņu konstrukcija aprēķināta saskaņā ar LVS EN 1991-1-1, LVS EN 1995-1-1 uz sniega slodži Daugavpils pilsētai un uz kritīšo priekšmetu ar masu līdz 2.0kg.
- Jumtīņa konstrukcijas savienošanai izmantos naglas vai pašgrēzējskrūves ar vai bez nagla plāksnēm, stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- Vissus izmērus precīzi uz vietas.
- Darba aizsardzības stenda shēma parādīta ka piemērs, bet var izmantota cita stenda konfigurācija.

Darbu un materiālu apjomi

Poz.	Nosaukums	Tehnisks raksturojums	Mēra v - ba	Daudz.	Piezīmes
1	Administrācijas un sirādnieku modulis	AxBxH 5.86x2.24x2.34,	m ²	13.10	
2	Ugunsdzēsības inventāra stends		gab.	1	Lāpsta, spaiņi, ķekši, putu aparāti
3	WC (biotuāletes)	AxBxH 1.20x1.40x2.34,	gab.	1	
4	Būvgružu konteineri	V=8.5m ³ -A x B x H 4.09x1.75 x 1.5	gab.	1	
5	Būvlaukuma nožogojums	BEK AERT vai analogi	p/m	125.0	
6	Orientējošs būvniecības atkritumu apjoms		t	28*	
7	Aizsardzības jumtiņš AJ		gb	6	
8	Gajeju aizsardzības jumtiņš AJ 1		m	~25.0	

Būvmehānismu raksturojums

Nosaukums	Izīces garums m	Izīces pacel's. augstums m	Izīces pacel's. augstums m	Cel'spēja, t
Autoceltnis KS3577-3k	14+7	7.5	21	uz balsta 2.0 bez balsta 0.6
Autotornis NISSAN "Cabstar"	-	-	-	-

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

plānā	Nosaukums
	Pārvaldes ēka
	Pārveidojamu pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta (saceltnes telpas, apsardze, darbu vadītājs, medpunkts)
	Būvgružu pagaidu glābšanas konteiners
	Materiālu nokraušanas vieta
	Biotuālele
	Būvlaukuma pagaidu nožogojums
	Ieejas aizsardzības jumtiņš AJ
	Celtniecības būvlaukuma inventāras nožogojums ar jumtiņu
	Autotransporta kustības virziens
	Ugunsdzēsības stends

Piezīmes:

- PIRMS BŪVDARBA UZSĀKŠANAS UZSTĀDĪT PAGaidu BŪVLAUKUMA NOŽOGUJUMU.
- KOKA SPĀRU PACELŠANA JUMTA KONSTRUKCIJU ATJAUNOŠANAI PĀREDZĒTA AR AUTOCELTNĪ KS-3577.
- BŪVMATERIĀLU PIEGĀDE UZ JUMTU PĀREDZĒTA AR AUTOTORNĪ VAI CITU PACELŠANAS MEHĀNISMU (ELEKTRISKAMEHĀNISKA VIŅČAI). AUTOTORŅA/AUTOCELŅA IZMETOŠANU UN NOŽOGUŠANU, KĀ ARĪ CITĀ MEHĀNISMA IERĪKOŠANU IZSTRĀDA BŪVUZŅĒMEJS DVP PROJEKTA.
- KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS LAIKĀ IEVĪROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS ATBILSTOŠĀI "MK 2003.25.02 NOT. Nr.92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS. VEICOT BŪVDARBUS".
- GAR MĀJU SAULES IELĀ 17A, IETIECĀMS VEIDOT GĀJĒJU TUNELI.
- BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTA BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNU, JA NEPIECIEŠAMS SASKANOT AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM, PAGaidu CEĻA SATIKSMES ORGANIZĀCIJU IZSTRĀDA BŪVUZŅĒMEJS DVP PROJEKTA UN SASKANO AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM (JA NEPIECIEŠAMS).
- PEC BŪVDARBU PABEIGŠANAS ATJAUNOT ESOŠO LABIEKĀRTOŠANU.

 SIA "NeoForm" Daugavpils, Varšavas 20-1 Būvkomersanta reģ. Nr. 12494	PASŪTĪTĀJS: Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums Reģ. Nr.41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils	IEPIRKUMS: Pas.Nr.DDZKSU-2022/225P
OBJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS DAUGAVAS IELĀ 24, DAUGAVPILĒ	JUMTA SEGUMA NOMAIŅA	
Anaats Proj.vad. Atļiecd.vad. Izstrādātājs	Uzvārds A.Grīgorjevs A.Grīgorjevs A.Grīgorjevs	Datums 02.2023. 02.2023. 02.2023.
Lapas nosaukums: Darbu organizēšanas shēma	Līguma Nr. DDZKSU-2022/225P Arhīva Nr. DDZKSU-2022/225P Mērogs: 1:500 Lapas Ras.Nr.	
