

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

(aizpilda trijos eksemplāros, ja dokuments tiek iesniegts papīra formā)

1 *ARU*

Ieceres ierosinātājs (pilnvarotā persona)

**SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums”**

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās
personas nosaukums)

Reģ.Nr.41503002485

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas
reģistrācijas numurs)

**Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,
t.65407274**

(adrese, tālruņa numurs)

1. Objekts **Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte
dzīvojamai mājai Saules ielā 17, Daugavpilī**

2. Būves vai telpu grupas kadastra apzīmējums **Zemes kad. Nr.0500-001-3117**

3. Adrese **Saules ielā 17, DAUGAVPILĪ, LV-5401**

(iela, pagasts, pasta indekss, stāvs)

4. Objekta īpašnieks

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

adrese, tālruņa numurs vai

**SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
Reģ.Nr.41503002485**

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, t.65407274

adrese, tālruņa numurs)

5. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti **Zemesgrāmatu apliecība**

I. Ieceres dokumentācija

6. Paredzēto darbu veids – fasādes apdares renovācijas/fasādes siltināšana/jumta siltināšana/ **jumta seguma remonts**/logu nomaiņa(vajadzīgo pasvītrot)

7. Atbildīgais projektētājs

**A/S „Komunālprojekts” Daugavpils nodaļas
vadītājs Juris Buklovskis**

(vārds, uzvārds)

Sert.Nr. 20-5045, derīgs līdz 11.08.2015.g.

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš)

8. Arhitekts*

(vārds, uzvārds)

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš)

9. Būvinženieris*

Juris Buklovskis,

(vārds, uzvārds)

Sert.Nr. 20-3588, derīgs līdz 11.08.2015.g.

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš)

10. Projektētāja apliecinājums.

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas (inženiertīklu stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Atbildīgais projektētājs

(paraksts)

14.09.2011.

(datums)

Arhitekts*

(paraksts)

(datums)

Būvinženieris*

(paraksts)

(datums)

Piezīme.

* Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.¹ nodaļas 40.⁶ punktu papildus pieaicinātie būvniecības speciālisti.

Pielikumā:

Paskaidrojuma raksts uz 2 lapām.

Dokumentu saraksts un lapu skaits:

1. Darba uzdevums (1 lpp).
2. Tehniskās apsekošanas akts(1lpp).
3. Zemesrobežu plāns (1 lpp).
4. Zemesgrāmatu apliecība (1 lpp).
5. Būvkomersanta apliecība Nr.2687-R (1 lpp)
6. Foto Nr.1...Nr.6 – (3 lpp).

Kopējais lapu skaits – 10 lapas.

Grafisko lapu saraksts un lapu skaits Rasējumi:

BK-1,BK-2,BK-3,BK-4,BK-5,BK-6,BK-7,BK-8

Kopējais rasējumu skaits – 8 lapas

11. Ieceres ierosinātāja apliecinājums.

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Aņņemos īstenot fasādes siltināšanu/jumta remonts/fasādes renovāciju logu nomaiņu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.


Ieceres ierosinātājs

 V. Dedele
(paraksts un tā atšifrējums)

14.09.2011.
(datums)

12. Būvvaldes lēmums.

(aizpilda tikai būvvaldes eksemplārā)



13. Nosūtīts pamatots būvvaldes atteikums.

Vēstule Nr. _____



Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(datums)

(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

II. Būvdarbi

14. Pasūtītāja iesniedtie dokumenti, uzsākot būvdarbus

Uzsākot būvdarbus, saskaņā ar ieceres dokumentāciju iesniedzu (vajadzīgo atzīmēt):

14.1. apdrošinātāja iesniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polīses kopiju;

14.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība, līguma kopiju par būvuzraudzību;

14.3. būvuzrauga saistību rakstu;

14.4. atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

14.5. _____

Būvuzņēmējs/būvētājs _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

adrese, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

adrese, tālruņa numurs)

Ieceres ierosinātājs _____

(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

15. Būvvaldes amatpersonas atzīme par dokumentu saņemšanu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

III. Būvdarbu pabeigšana

16. Pasūtītāja informācija par būvdarbu pabeigšanu.

Iesniedzu būvvaldē segto darbu pieņemšanas akta un parakstīto darbu izpildes aktu kopijas:

Ieceres ierosinātājs

(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

17. Būvdarbu pārbaude

Apsekota būve dabā un konstatēts, ka būvdarbi veikti ieceres dokumentācijā norādītajā apjomā atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Būvvaldes atbildīgā amatpersona

(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

Piezīmes:

1. * Pasūtītājs katru apliecinājuma kartes daļu iesniedz atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju, uzsākot būvdarbus un tos pabeidzot. Atkarībā no ieceres būvvaldē var vienkāršot apliecinājuma kartes veidlapu.
2. **Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- 3.2. apakšnodaļas 40. punktu papildus pieaicinātie būvniecības speciālisti.

**Tehniskais uzdevums projektēšanai (Ēkas fasādes vienkāršotās
renovācijas apliecinājuma karte)**

1. Projekta arhitektūras un celtniecības daļu drīkst izstrādāt tikai sertificēts inženieris, arhitekts vai licenzēta projektēšanas organizācija.
2. Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības, ugunsdrošības normas un citus saistošus noteikumus, kā arī pilsētas apbūves noteikumus.
3. Projektu izstrādāt ievērojot Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta prasības tai skaitā "krāsu pasi".
4. Izstrādājot projektu jumta kapitālam remontam vai nomaiņai, paredzēt pietiekošu ventilāciju bēniņiem.
5. Izstrādājot projektu obligāti veikt apsekošanu kopā ar SIA „DDzKSU” ēku inženieri, projektā paredzēt jumta seguma nomaiņu un ja nepieciešams koka konstrukciju stiprināšanu vai nomaiņu.
6. Izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (karnīzes, kores, ja tiks paredzēta jumta logu izbūve- jumta loga konstruktīvo risinājumus un mezglus un citus jumta rekonstrukcijas nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu kvalitatīvu jumta tālāku ekspluatāciju) un veikt bēniņu pārseguma siltināšanas siltumtehniko aprēķinu un sniegt mezglus siltināšanas darbu veikšanai (paredzēt laipas līdz apkures caurulēm un jumta logiem). Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšana nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, lai nebūtu asas temperatūras izmaiņas, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.
7. Saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un ar SIA "DDzKSU" projekta dokumentāciju.

Ar cieņu

SIA „DDzKSU”

DZĪVOJAMĀS MĀJAS SAULES IELA 17
JUMTA NESOŠO PAMATKONSTRUKCIJU, JUMTA SEGUMA UN BĒNIŅU
PĀRSEGUMA SILTINĀTĀJA
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

1. Visparīgā daļa

Saskaņā ar SIA „DDzKSU” pieteikumu un programmu izdevumu A/S „Komunālprojekts” pārstāvji SIA „DDzKSU” darbinieku klātbūtnē izpildīja jumta nesošo pamatkonstrukciju, jumta seguma un bēniņu pārseguma siltinātāja tehniskā stāvokļa apsekošanu.

Apsekošanas mērķis ir jumta nesošo konstrukciju renovācijas projekta izpildīšana, jumta seguma un bēniņu pārseguma siltinātāja nomaiņa.

2. Apsekošanas rezultāti

Apsekošanas gaitā tika konstatēts sekojošais:

- Jumts 1-slīpes. Uz jumta uzstādīto viena jumta izejas lūka. Bēniņos galvena un sānu zeltiņos ir divas logu ailes (400x400 h, d=400) bēniņu vēdināšanai. Pašlaik tās ir daļēji slēgtas. Uzturēt jumtu logus pēc normatīviem.
- Spāru sistēma sastāv no mūrlatām, statņiem, atgāžņiem, garensijām un pašām spārēm. Sistēmas elementi daļēji noaptētiem guļbaļķiem. Mūrlata 2-šķautnēs nošķelšbaļķi (170x170h) . Ir apmierinošā stāvoklī. Konstatētas tikai dažas spārupuves bojātas vietas. Ir nepieciešamība tu jānomaina.
- Jumta segums – šīfera taisnos posmos un no gluda skārda pie dzegas. Jumta segums un latojums ir pilnīgi jānomaina.
- Siltinātājs – noblīvētu izdedžu uzbērums – 60 mm.
Veikt efektīvāku siltinātāju papildslāni likšanu.
- Tualešu kanalizācijas ventilācija – izvads uz bēniņiem. Nepieciešams izpildīt izvadu virs jumta.
- Ir jumta nozogojuma trukums. Uzstādīt.

Apsekošanu izpildīja:

A/S „Komunālprojekts” būvtehniķe:

SIA „DDzKSU” inženieris:



N. Popkova



IZSNIEGTA
ZEMESGRĀMATU APLIECĪBA

LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS PILSĒTĀ

Saules ielā Nr.17

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500-001-3117

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2002.gada 28.janvāra pasūtījumam Nr.35 un

Daugavpils pilsētas Domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2002.gada 06.maija pasūtījumam Nr.129

Robežu plāns sastādīts mērogā M 1:500 pēc 2002.gada uzmērīšanas materiāliem

Zemes kopplatība ir 860 kv.m.



VALSTS ZEMES DIENESTS
Dienvidlatgales reģionālā nodaļa

L.Kirčenko


H. PUTINS

11. 06. 2002.

ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS

Nr.	X	Y
85	194464.34	657364.46
7	194458.40	657368.48
118	194450.15	657373.86
108	194440.16	657380.36
107	194439.91	657379.97
129	194431.61	657367.62
128	194428.18	657369.89
127	194426.96	657368.08
126	194425.82	657366.37
125	194423.44	657362.89
124	194421.88	657363.94
123	194421.27	657363.03
122	194419.36	657364.32
121	194417.97	657364.93
120	194416.09	657362.13
6	194418.20	657360.73
112	194419.08	657360.15
2	194434.43	657349.98
113	194434.16	657349.62
70	194432.08	657346.29
114	194439.98	657340.64
115	194442.59	657344.59
116	194449.58	657355.15
119	194452.79	657353.03
117	194455.53	657351.14


ZEMES IZVIETOJUMA SHĒMA

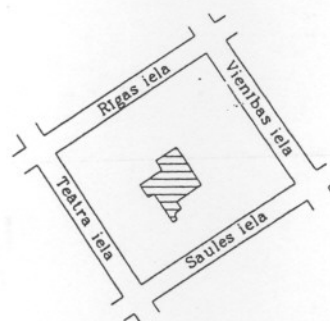

LKS-92TM

Mēroga koeficients :0.999902

Kopplatība - 860m2

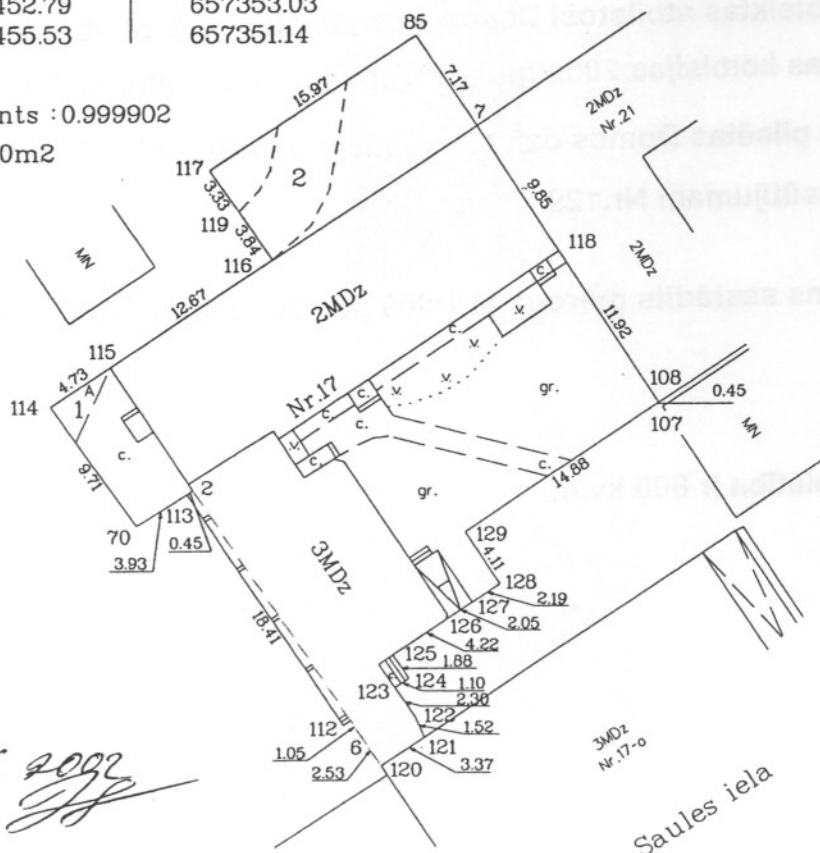

07.06.2002



Aprobežojumi:

1.Ceļa servitūts - 7m2

2.Ceļa servitūts - 39m2

Orto-fotokartes Nr.2443-42-53

MĒROGS 1:500

LR VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas
Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības,
topogrāfijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas daļa

Daļas vadītājs	Dz.Krūtkrāmelis	23.05.2002
Kartogrāfs	J.Smironovs	15.05.2002
Plānu zīmēja	J.Smironovs	15.05.2002



Zemesgrāmatu apliecība

Daugavpils zemesgrāmatu nodaļa

Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodaļējums Nr. 1000 0007 4368

Kadastra numurs: 0500 001 3117

Daugavpils pilsēta, Saules iela 17

I.daļa 1.iedaļa			
Ieraksta Nr.	Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Kopīpašuma domājamā daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0500 001 3117.		860 kvm
1.2.	Uz zemes gabala atrodas trīsstāvu ķieģeļu mūra dzīvojamā māja ar 5 dzīvokļiem, kopējā platība 942,6 kvm. (kad.ap.0500 001 3117 002), divstāvu ķieģeļu mūra dzīvojamā māja ar 7 dzīvokļiem, kopējā platība 474,9 kvm, (kad. ap. 0500 001 3117 003) un pagrabu.		
II.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Īpašnieks, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Domājamā daļa	Summa, par kādu iegūts īpašums(Ls)
1.1.	Īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000077325.	1	
1.2.	Pamats: 2002. gada 27. jūnija Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.514 un 2002. gada 14. marta lēmums Nr.192, 2002. gada 26. jūlija Daugavpils pilsētas domes uzziņa par nekustamu īpašumu Nr.02.01-08/1033, 2001. gada 17. septembra zvērināta revidenta apliecināta Daugavpils pilsētas domes izziņa Nr.02.01-08/1995.		
III.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Lietu tiesības, kas apgrūrina nekustamu īpašumu		Platība, lielums
1.1.	Atzīme - ceļa servitūts.		7 kvm
1.2.	Atzīme - ceļa servitūts.		39 kvm
1.3.	Pamats: 2002. gada 26. jūlija Daugavpils pilsētas domes uzziņa par nekustamu īpašumu Nr.02.01-08/1033.		

Žurnāla Nr. 300000294420, datums 26.07.2002

Lēmuma datums: 29.07.2002

Kancelejas nodeva Ls 23,00 samaksāta

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis

Zemesgrāmatu apliecība satur tiesnesa lēmumu un informāciju par īpašuma sastāvu.

Jānis Radlonovs





LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-7013101 ♦ Fakss 371-7280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

R ī g ā

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegta
akciju sabiedrībai
Komunālprojekts

vienotais reģistrācijas numurs : 40003005372

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2006.gada 19.maijā
(lēmums Nr. 2783) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2687-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums : 19.maijs

Atbildīgā amatpersona -
Būvniecības stratēģijas nodaļas vadītājs



Komersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā nosaka:

- Būvniecības likuma 10. pants,
- Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Komersants drīkst veikt komercdarbību tajās būvniecības jomās, kurās komersanta atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstošs būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts vai, ja persona attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība.

Reģistra informācijas atjaunošana

Komersants 14 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas sniedz reģistra iestādei informāciju par šādām iesniegumā sniegto ziņu izmaiņām:

1. komersanta nosaukums (firma), veids, juridiskā adrese vai korespondences adrese;
2. ziņas par personām, kas ir atbildīgas par būvniecību un kurām ir patstāvīgas prakses tiesības Būvniecības likuma 8.panta pirmajā daļā minētajās būvniecības jomās, kā arī ziņas par līgumu, ko minētās personas ir noslēgušas ar komersantu;
3. ziņas par personām, kuras ir atbildīgas par darba aizsardzību, un dokumentiem, kas apliecina attiecīgo personu kompetenci.

Ikgadējā informācijas atjaunošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 22. punktu,

Komersants reizi gadā līdz reģistra iestādes noteiktajam datumam iesniedz reģistra iestādē ziņas par iepriekšējo gadu.

1. ziņas par nodarbināto skaitu:
 - 1.1. kopējais nodarbināto skaits;
 - 1.2. būvniecībā nodarbināto skaits;
2. ziņas, kas raksturo komercdarbību būvniecībā:
 - 2.1. komersanta izpildīto būvdarbu apjoms (2.3. un 2.4. apakšpunktā norādīto apjomu summa);
 - 2.2. saskaņā ar līgumiem kopā ar apakšuzņēmējiem veiktā būvniecība (neskaitot ieguldījumu pamatlīdzekļos);
 - 2.3. saskaņā ar līgumiem bez apakšuzņēmējiem veiktā būvniecība (neskaitot ieguldījumu pamatlīdzekļos);
 - 2.4. komersanta paša vajadzībām izpildīto būvdarbu apjoms – ieguldījums pamatlīdzekļos;
 - 2.5. komersanta samaksātā sociālā nodokļa summa;

Ja reģistra iestādes rīcībā nonākusi informācija, kas neatbilst reģistrā norādītajām ziņām, reģistra iestāde pārbauda attiecīgās ziņas un, ja nepieciešams, pieprasa komersantam sniegt precizētu informāciju.

Ja komersants noteiktajā termiņā nav sniedzis reģistra iestādei ziņas, reģistra iestāde pieņem lēmumu par komersanta svītrosanu no reģistra.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Doto dzīvojāmas mājas Saules ielā 17 jumta un bēniņu pārseguma siltinātāja nomaiņas projektu izstrādāja A/S „Komunālprojekts” 2011.gada septembrī pēc SIA „DDzKSU” pasūtījuma.

1. Jumta segums

Esošais jumta segums izpildīts no jumtu šifera. Daudzās jumta seguma vietās ieloku savienojumos un jumta dzegas daļā ir caurteces. Pēc dotā projekta esošais jumta segums un latojums tiek demontēti. Paredzēta jauna latojuma un jumta seguma ierīkošana. Arī tiks izpildīti kanalizācijas izvadi no bēniņiem uz jumtu un jumta nožogojuma uzstādīšanu.

Jumta segums ieprojektēts no bezasbesta viļnotu loksnēm „ETERNIT” P-8 „KLASIKA”. Pieņemto jumta segumu raksturlielumi doti rasējumos BK.

Bēniņu telpas normālas ventilācijas nodrošināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:

- vēdcaurumi jumta dzegas un kores daļā;
- ventilācijas režģu uzstādīšana zelmeņu ailās;
- jumta logu uzstādīšana.

2. Spāru sistēma

Esošā koka spāru sistēma ir apmierinošā stāvoklī. Apsekošanas gaitā tika konstatētas tikai dažas spāru sistēmas konstrukciju puves bojātas vietas. Šos konstrukciju elementus dotajā projektā ir paredzēts nomainīt.

3. Bēniņu pārsegums

Pēc apsekošanas rezultātiem esošais bēniņu pārseguma siltinātājs ir blīvēti katlu izdedži. Vajadzīga veikt efektīvāku siltinātāju papildslāni likšanu.

Par siltinātāju pieņemta BERAMA vate 220 mm biezumā (PAROC BLT-9 vai analogs).

Deklarēta $\Delta\lambda_{c1}=0.042 \text{ W/m}\cdot\text{k}$, labojuma k-ts $\Delta\lambda_w=0.002 \text{ W/m}\cdot\text{k}$ (LBN 002-01, 2.tab.)

Aprēķina siltumvadītspēja $\lambda_d=0.042+0.002=0.044 \text{ W/m}\cdot\text{k}$.

$U_{RN} = 0.2 \times k$ (normatīva vērtība)

$K = 19 / (Q_i - Q_l)$,

Q_i – iekštelpu aprēķina temperatūra $+18^\circ\text{C}$

Q_l – āra gaisa videjā temperatūra apkures sezonā -1.3°C (LBN 003-01)

$K = 19 / (18 + 1.3) = 0.984$,

$U_{RN} = 0.2 \cdot 0.984 = 0.197 \text{ W/m}^2\text{k}$ (LBN 002-01, 1.tab.)

Tehniskā pretestība:

$R_T = R_{S1} + R_1 + R_2 + R_3 + R_{SE}$

$R_{S1} = 0.1 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ – iekšējās virsmas termiskā pretestība

$R_{SE} = 0.04 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ – ārējās virsmas termiskā pretestība

R_1, R_2, R_3 – griestu apmetuma, koka vairogu un siltumizolācija tehniskās pretestības

$R_T = 0.1 + 0.02/0.9 + 0.07/0.06 + 0.2/0.044 + 0.04 = 5.88 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$

$U = 1/R_T = 1/5.88 = 0.170 < U_{RN} = 0.197 \text{ W/m}^2\text{k}$

Pieņemtais risinājums atbilst LBN 002-01 normatīvu prasībām.

4. Tualešu kanalizācijas ventilācijas izvadus izpildīt virs jumtu.

Būvprojekta vadītājs



BŪVINŽENIERIS
Juris BUKLOVSKIS
Sertifikāts Nr. 20-5045



f-1




f-2



f-3



f-4

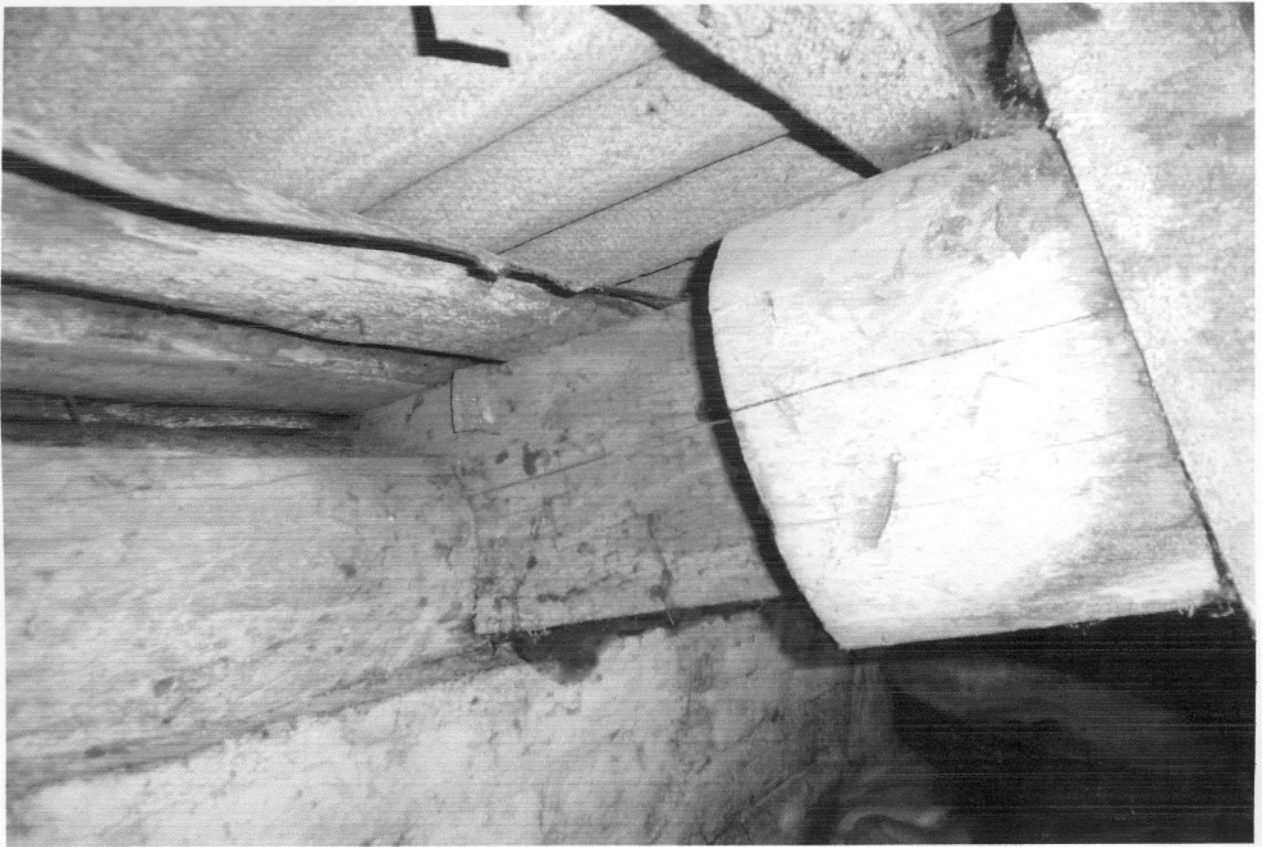

f-5



f-6

RASĒJUMU KOMPLEKTA SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
BK-1	VISPĀRĒJIE DATI	
BK-2	BĒNIŅU PLĀNS-SHĒMA. BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETĀĻAS.	
	KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA (BK-1). DURVJU UN LOGU SPECIFIKĀCIJA	
BK-3	JUMTA PLĀNS-SHĒMA. BĒNIŅU LOGS BL-1. SPECIFIKĀCIJA.	
BK-4	SPĀRU PLĀNS. SPECIFIKĀCIJA.	
BK-5	GRIEZUMI 1-1, 2-2, 3-3, a-a. MEZGLS 1.	
BK-6	MEZGLI 2,3,4. GRIEZUMI 4-4, b-b.	
BK-7	Bēniņu logs BL-1. Griezumi. Mezgli	
BK-8	Bēniņu logs BL-1. Poz.2,4,6,8,9. Specifikācija.	

SASKAŅOTS

SIA "Daugavpils Dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums"
Ražošanas tehniskās nodaļas
vadītāja V.Ragele
2011.g. 11. septembrī

PIEZĪMES:

1. PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI NORĀDĪTI RASĒJUMA LAPĀS

Ši būvprojekta BK daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas J.BUKLOVSKIS
vadītājs (vards, uzvards)
20-3588
(sertifikāta Nr.)

2011. 09.
(datums)

(paraksts)



KOMUNĀLPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REGISTR.Nr.2687 - R


Būvobjekta nosaukums

ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA
KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI SAULES ielā 17, DAUGAVPILĪ.


Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs
NOD.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		09.2011	VISPĀRĒJIE DATI
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		09.2011	Pasūtījuma Nr. 11-31-017
BŪVTEHNIKE	N.POPKOVA		09.2011	Mērogs
Arh. reg.Nr.	9650			Stadija TP
				Lapas Nr. BK-1
				Lapu sk.

BĒNIŅU PLĀNS


BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETĀLAS

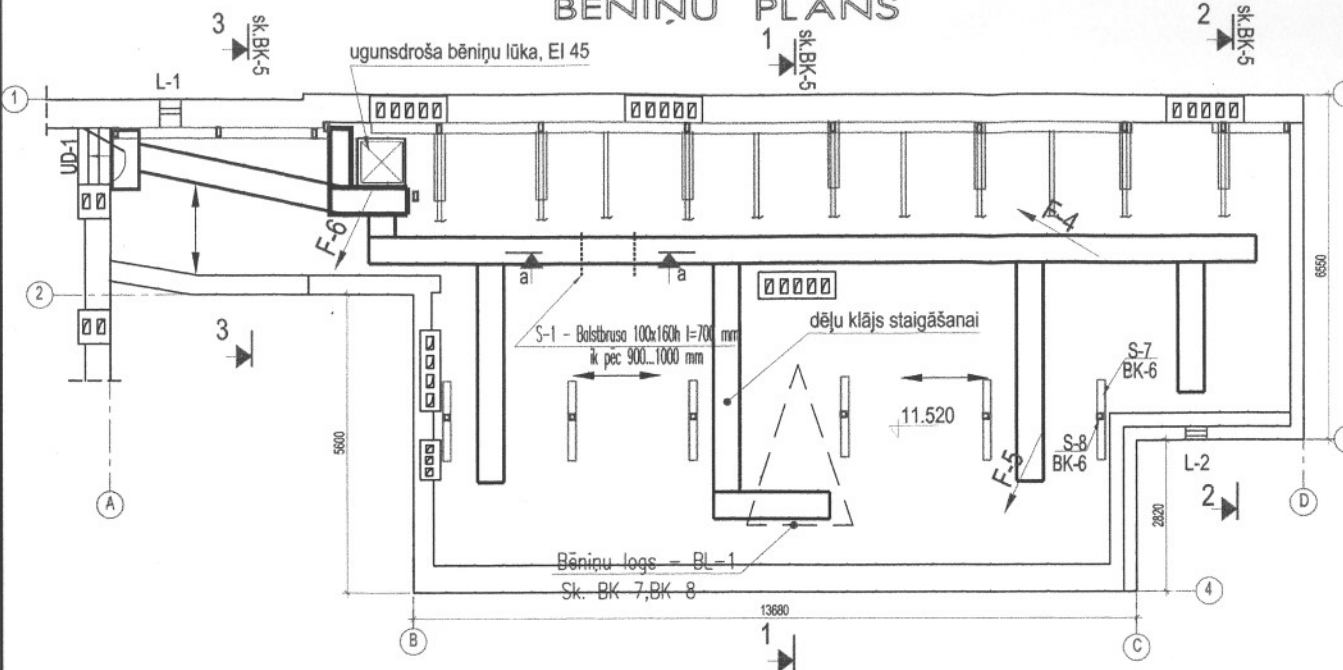

PAROC BLT 9 - 136 m²



BĒNIŅU KONSTRUKCIJA BK-1.
GRIEZUMS a-a, sk. piez. Nr.3



KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	ŠKĒRSGRIEZUMS	GARUMS, m	TILPUMS, m ³
S-1	□ 100x200h	29.4	0.6
S-2	DĒĻI - b=25	21 m ²	0.53
KOPĀ:			1.13

LOGU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	SKICE	IZSTRĀDĀJUMU IZMĒRI, mm BxH	SKAITS gab.		PIEZĪMES
			bēniņu stāvs	kopā	
1	2	3	4	5	6
L-1		400x400	1	1	VIENVĒRTNES ATVĒRAMS VĒDINĀŠANAS LOGS AR ŽALŪZIJĀM AR VIENU ATVĒRES POZĪCIJU
L-2		Ø400	1	1	VIENVĒRTNES ATVĒRAMS VĒDINĀŠANAS LOGS AR ŽALŪZIJĀM AR VIENU ATVĒRES POZĪCIJU

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	SKICE	AILES IZMĒRI HxB, mm	SKAITS gab.	PIEZĪMES
UD-1		1800x960	1	EI30 ugunsdrošās vienvērtnes durvis

PIEZĪMES.


1. LAPU SK. KOPĀ AR BK-1...BK-8.
2. KARNĪZU UN PARAPETU DETĀLAS SK. "BK-6" LAPĀ.
3. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA:
 - a) DĒĻU KLĀJS - 42m
 - b) GULSNIS 700x100x200h - 29.4m
4. BĒNIŅU LOGU BL-1, SK. BK-7, BK-8.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:


- ESOŠĀS KIEGELU ĀRSIENAS 510 mm BIEZUMĀ, h=400 mm (pa asīm "2","4"), h=500 (pa asi "3") +h=800(250 mm biezumā)
- GARENGULBĀLKIS 200x100h mm
GARENGULBĀLKIS 200x140h mm
- STATNIS (170x80) IK PĒC 1.0...2,75 m
- STATNIS (170x80) AR DIAGONĀLATGĀZNIM (80x120h mm)
- NESOŠAS KONSTRUKCIJAS VIRZIENS (koka sijas)

				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI SAULES IELĀ 17, DAUGAVPILĪ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas gatura			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		09.2011	BĒNIŅU PLĀNS-SHĒMA. BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETĀLAS. KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA (BK-1). DURVJU UN LOGU SPECIFIKĀCIJA			
BŪVTEHNIKE	N.POPKOVA		09.2011	Posūījuma Nr.	11-31-017	Mēroga	Stadija
Arh. reg.Nr.	9650			Saskaņots		1:100	TP
						Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-2	

JUMTA PLĀNS

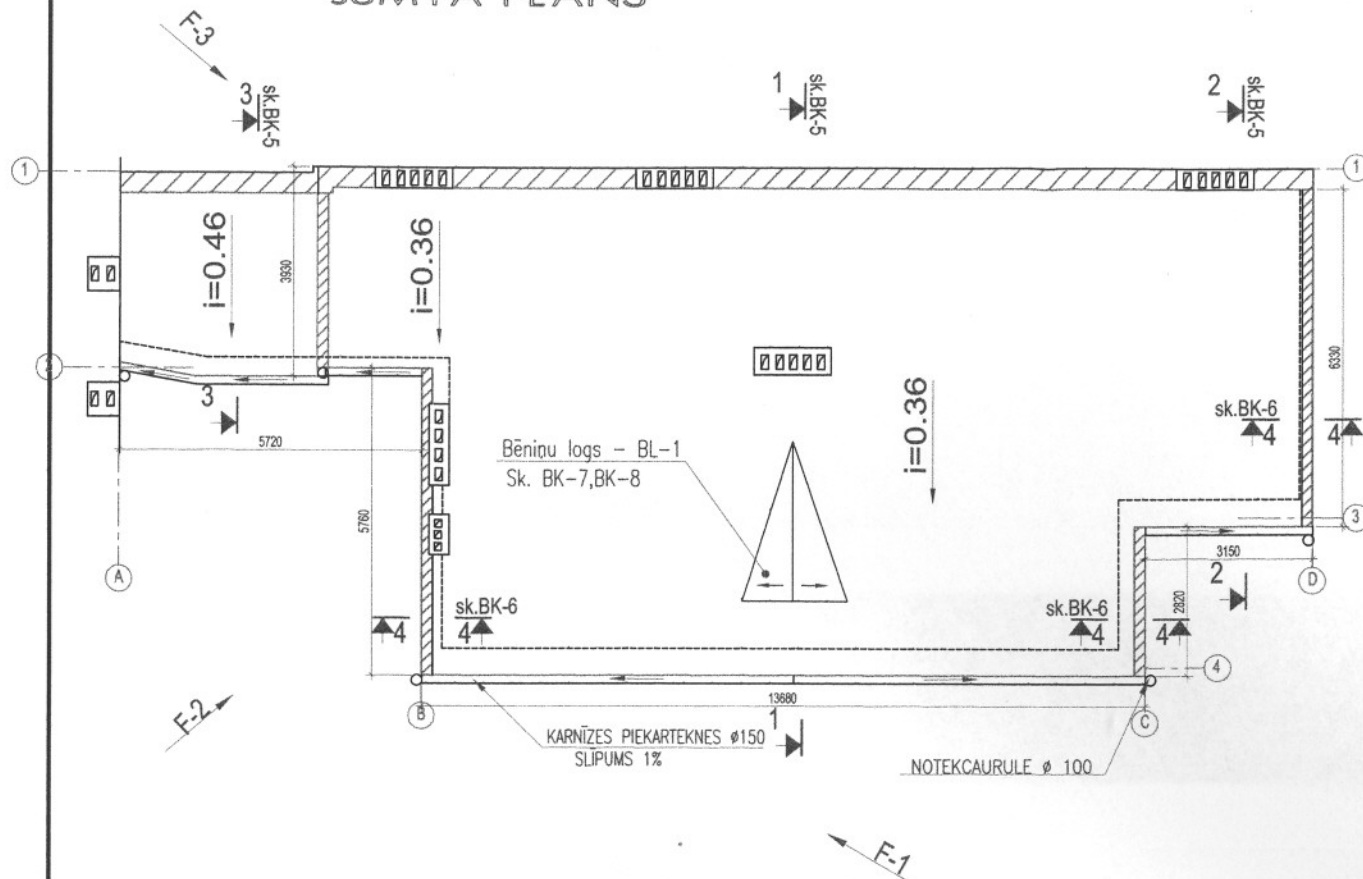

BĒNIŅU LOGS, BL-1, M 1:25

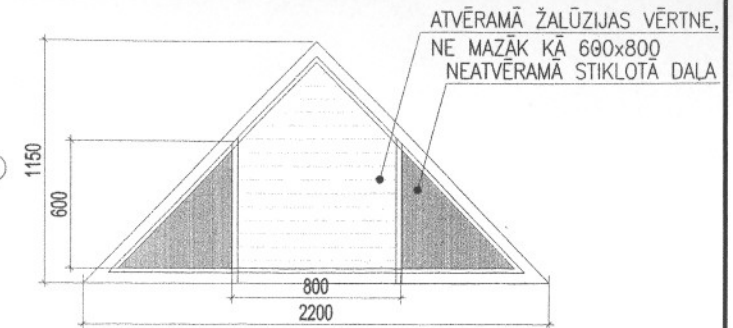

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- CINKOTS JUMTA SKĀRDS
- JUMTA SEGUMS - "ETERNIT" LOKSNE
TONIS - PELĒKA
- PROJEKT.CILVĒKU DROŠĪBAS BARJERA h=600 mm
- FOTOGRAFĒŠANAS VIRZIENS
- JUMTA SLĪPUMS


ELEMENTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	NOSAUKUMS	MASA kg	DAUDZUMS	KOPMASA kg	PIEZĪME
1	KOKMATERIĀLI		3.63m ³		
2	BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA: BERĀMĀ VĀTĒ PAROK BILT9		136 m ²	30m ³	b=220 mm
3	JUMTA SEGUMS: "ETERNIT", TONIS - PELĒKS		180m ²		
4	CINKOTAIS SKĀRDS		41m ²		
5	CILVĒKU DROŠĪBAS BARJERA (PELĒKA)		23		
6	TEKNE Ø150 (TUMŠI PELĒKA)		23		
7	CAURULE Ø100 (TUMŠI PELĒKA)		49.1		

PIEZĪMES:

- CILVĒKU DROŠĪBAS BARJERS (TUMŠI PELĒKA), KOP.GARUMS - 23 m.
- KARNĪZU UN PARAPETU DETALAS SK. "BK-6" LAPĀ.
- BĒNIŅU LOGU BL-1 KONSTRUKCIJU, SK. BK-7, BK-8.
- GRIEZUMI 1-1, 2-2, 3-3 SKATĪT BK-5
- GRIEZUMS 4-4 SKATĪT BK-6

KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DŽĪVOJAMAI MĀJAI SAULES ielā 17, DAUGAVPILĒ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				JUMTA PLĀNS-SHĒMA. BĒNIŅU LOGS BL-1. SPECIFIKĀCIJA.			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		09.2011	Pasūtījuma Nr.	11-31-017	Mērogs	Stādīja
BŪVTEHNIKE	N.POPKOVA		09.2011	Saskaņots		1:100	TP
Arh. reg.Nr.	9650					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-3	

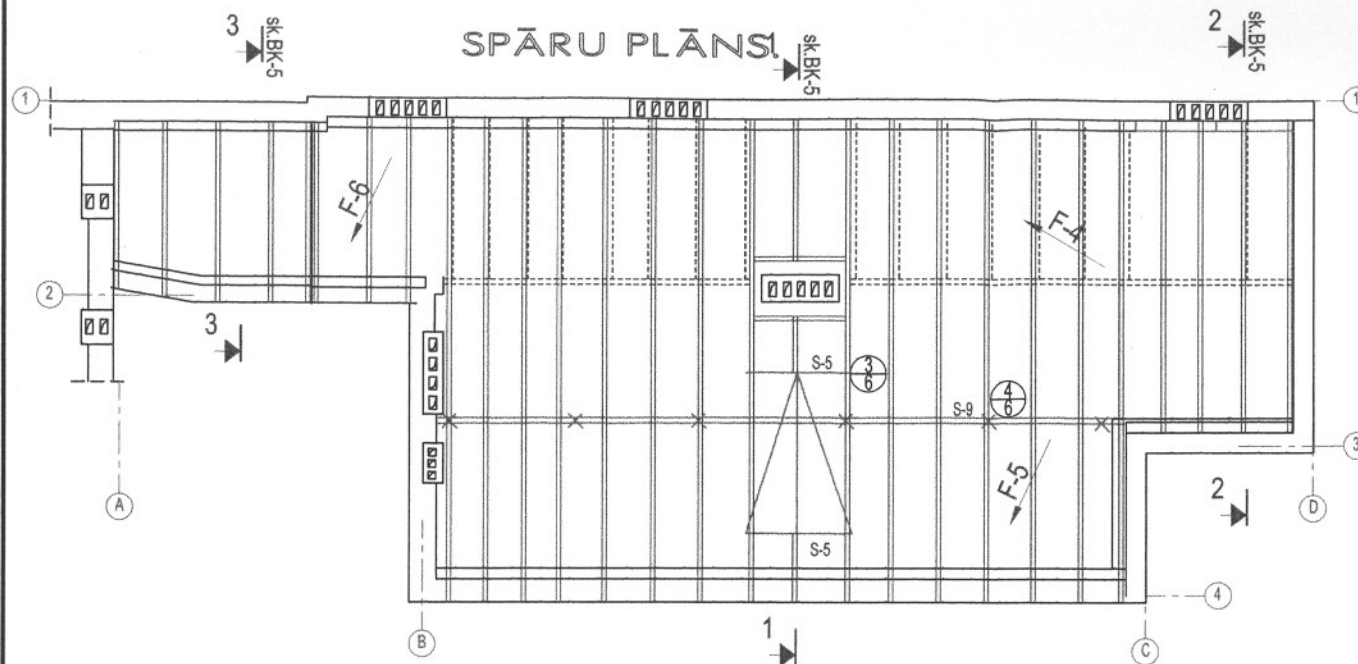

KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	ŠKĒRSGRIEZUMS	GARUMS, m	TILPUMS m ³
1	□ 50x50	250.4	0.63
2	□ 60x180	59	0.64
3	DĒĻ - b=50	20m ²	1.0
4	DĒĻ - b=25	8.0m ²	0.2
5	□ 60x170	4.0	0.041
6	□ 150x80	9	0.11
7	□ 100x150	13.0	0.20
8	□ 100x100	8.1	0.081
	KOPĀ:		2.90


ZĀĢMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

POZ.	NOSAUKUMS	ŠKĒRSGRIEZUMS	GARUMS, mm	SKAITS gab	KOPGARUMS m	PIEZĪME
S-1	LATOJUMS	S-1 □ 50x50	-	-	245.4	BK-5,6
S-2	SPĀRE	S-2 □ 60x180(h)	-	-	59	esošu spāru nomaiņa (20% apjomā)
S-3	DĒĻIS	S-3 - b=50	-	-	20m ²	BK-6
S-4	DĒĻIS	S-4 - b=25	-	-	8.0m ²	BK-5,6
S-5	LATOJUMS	S-5 □ 60x170	-	-	4.0	BK-6
S-6	ŠKAUTNĪTIS	S-6 □ 50x50	420/400	6/6	4.92	BK-6
S-7	GULBALKIS	S-7 □ 150x80h	1500	6	9	BK-5,6
S-8	STATNIS	S-8 □ 100x100	1350	6	8.1	BK-5,6
S-9	JUMTA KOPTURIS	S-9 □ 100x150h	13000	1	13.0	BK-5,6


- JUMTA KOKA KONSTRUKCIJAS UN LATOJUMS JĀPĀRKĻĀJ AR UGUNIS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM, KAS NODROŠINA VISMĀZ B-SI, d2 UGUNISREAKCIJAS KLASI.
- GALĻ, NESOŠO KONSTRUKCIJU SASKARES VIETAS AR CITIEM MATERIĀLIEM UN SAVĀ STARPĀ JĀAPSTRĀDĀ AR 200. MARKAS ANTISEPTISKAJAM PASTĀM.
- KOKA KONSTRUKCIJAS IZGATAVOT NO SKUJKOKU II ŠKIRAS KOKSNES, MITRUMS NE LIELĀKS PAR 20%.
- VISAS KOKA KONSTRUKCIJAS IZOLĒT NO BETONA UN MŪRA AR DIVĀM PĀPES, RUBEROĪDA VAI PERGAMĪNA KĀRTĀM.
- VISUS KOKA SAVIENOJUMUS SAVĀ STARPĀ STIPRINA AR NAGLĀM (GOST 4028-81) UN METĀLA SKAVĀM Ø8A1.
- DARBA APJOMOS IEKLAUTA ESOŠO SPĀRU NOMAINA 25% APJOMĀ.
- GRIEZUMI 1-1, 2-2, 3-3 SKATĪT BK-5

KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodala BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI SAULES ielā 17, DAUGAVPILĪ.			
Amats		Uzvārds		Paraksts		Datums	
PR.VADĪT.		J.BUKLOVSKIS				09.2011	
BŪVTEHNĪKE		N.POPKOVA				09.2011	
Arh. reg.Nr.		9650					
Lapas nosaukums SPĀRU PLĀNS. SPECIFIKĀCIJA.							
Pasūtītāja Nr.				11-31-017		Mērogs	Stadija
				Saskaņots		1:100	TP
						Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-4	



GRIEZUMS 1-1

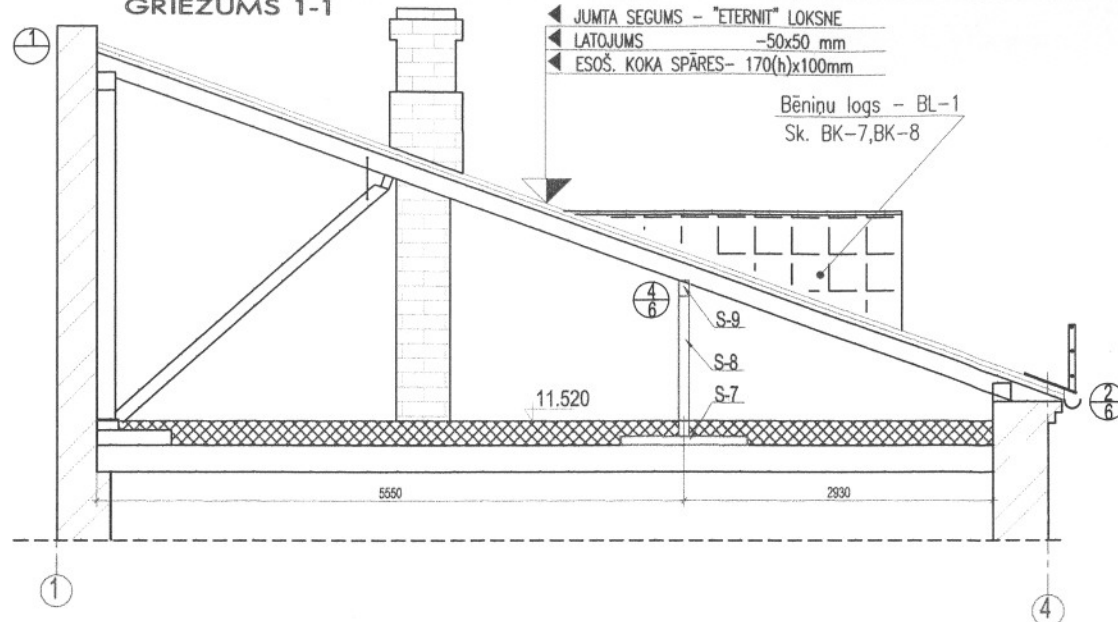


GRIEZUMS 2-2

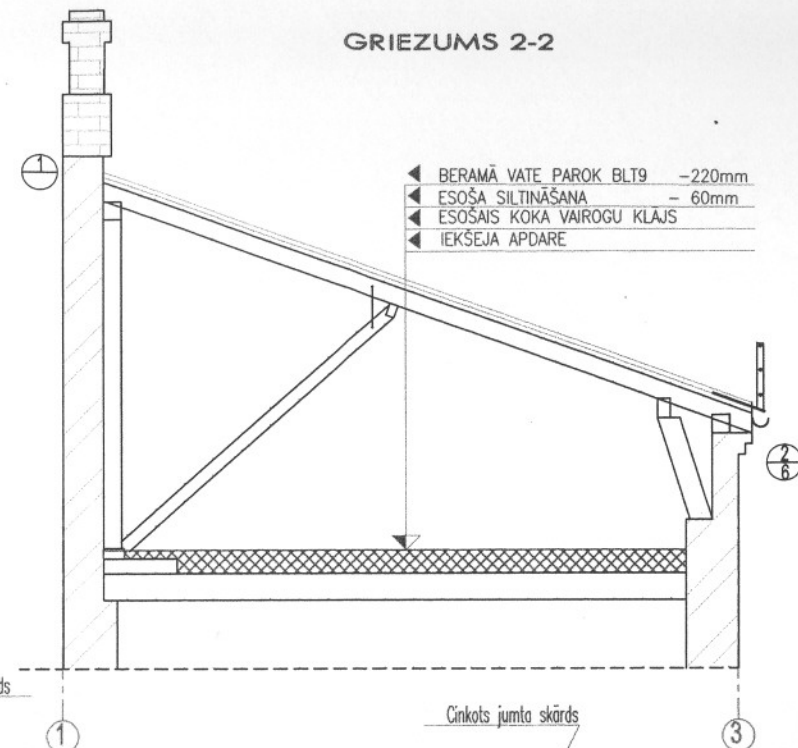


GRIEZUMS 3-3

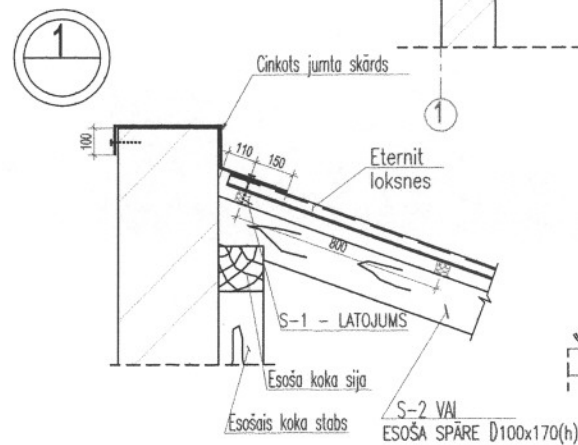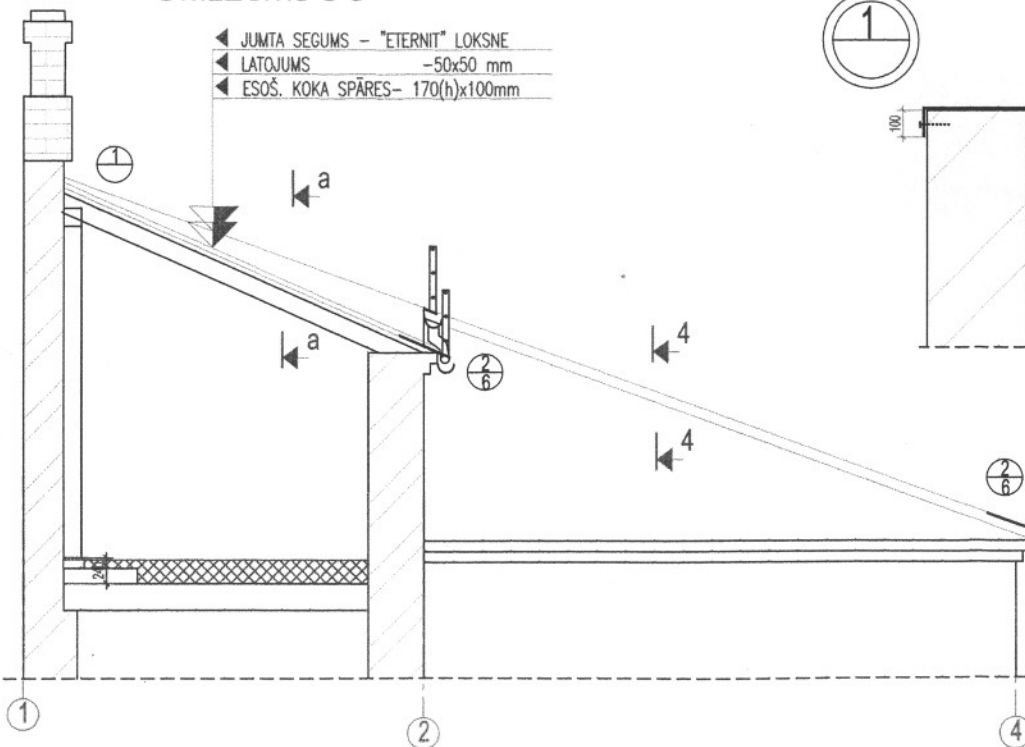





GRIEZUMS a-a

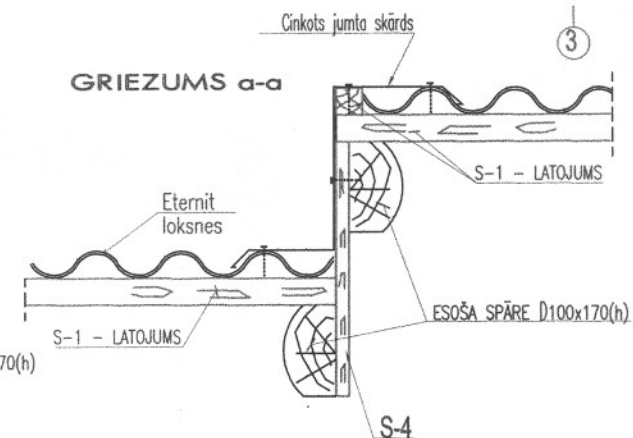

KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DŽĪVOJAMAI MĀJAI SAULES ielā 17, DAUGAVPILĪ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				GRIEZUMI 1-1, 2-2,3-3,a-a. MEZGLS 1.			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		09.2011	Pasūtījuma Nr.	11-31-017	Mērogs	Stadija
BŪVTEHNIKE	N.POPKOVA		09.2011	Saskaņots		1:50	TP
Arh. reg.Nr.	9650					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-5	

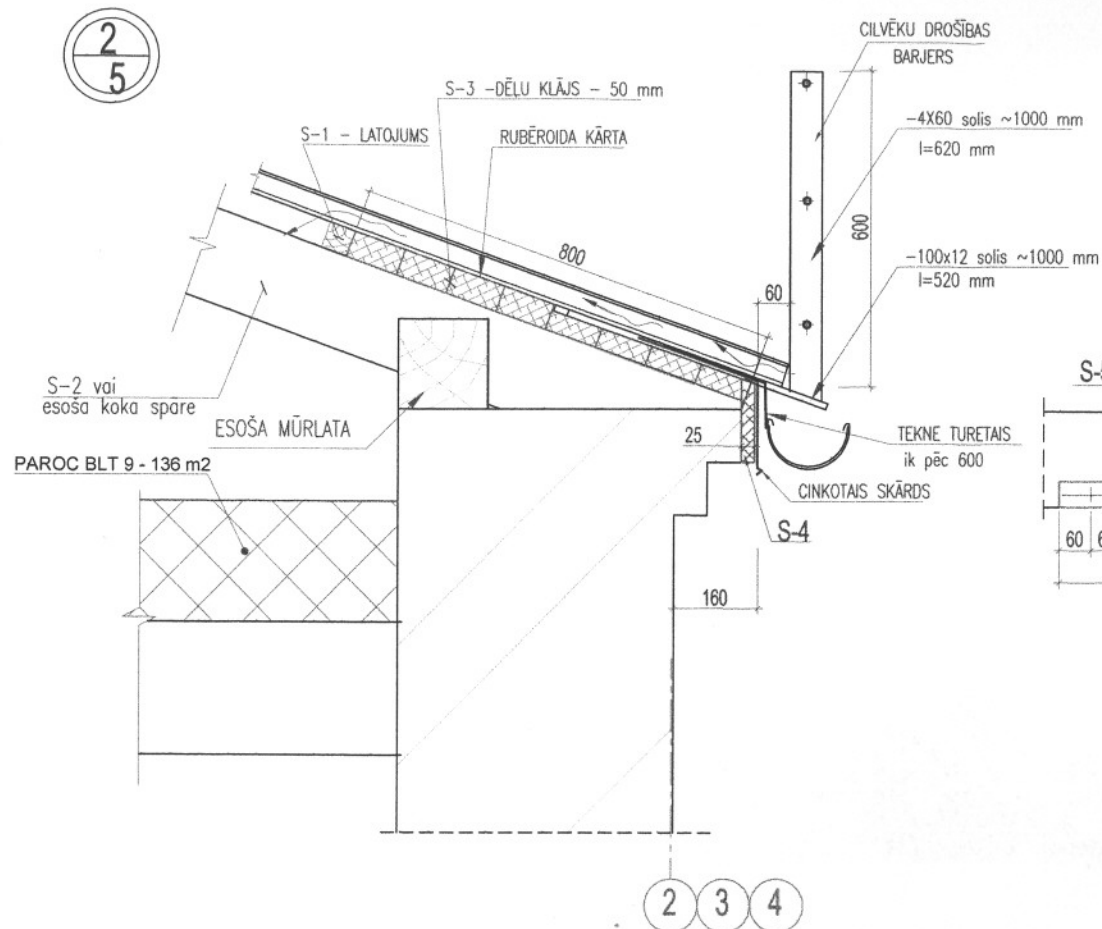


GRIEZUMS 4-4

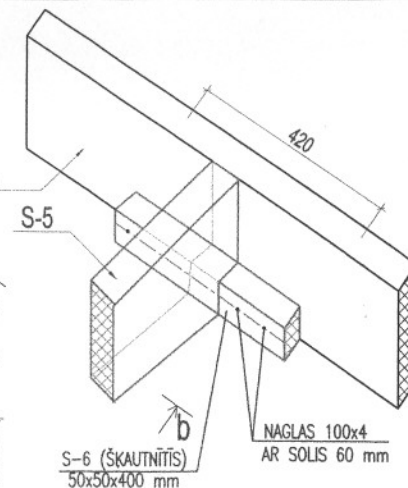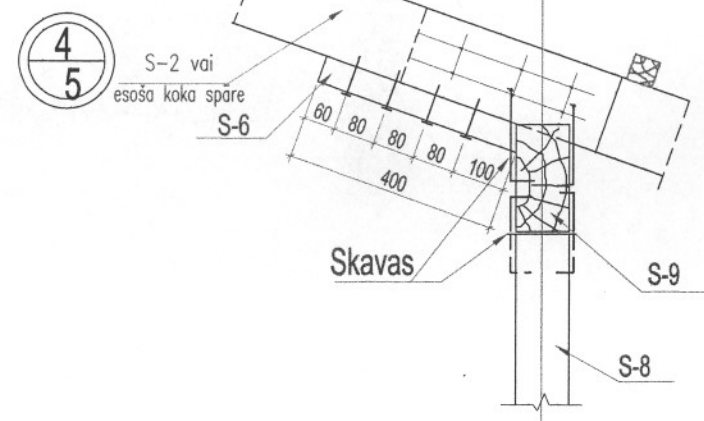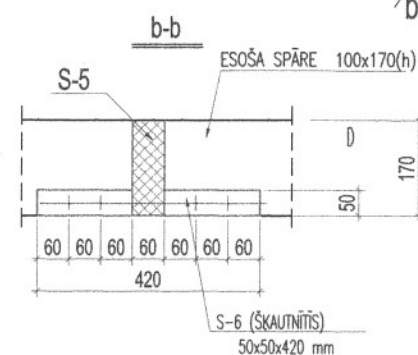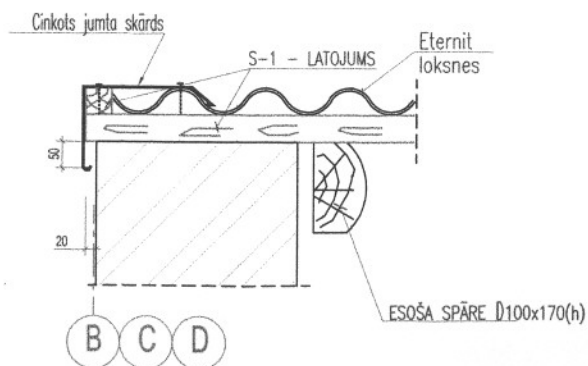


KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2887 - R				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI SAULES IELĀ 17, DAUGAVPILĒ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				MEZGLI 2,3,4. GRIEZUMI 4-4, b-b.			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		09.2011	Posūtījuma Nr.	11-31-017	Mērogs	Stadija
BŪVTEHNIKE	N.POPKOVA		09.2011	Saskaņots		1:100	TP
Arh. reg.Nr.	9650					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-6	





BĒNIŅU LOGS BL-1

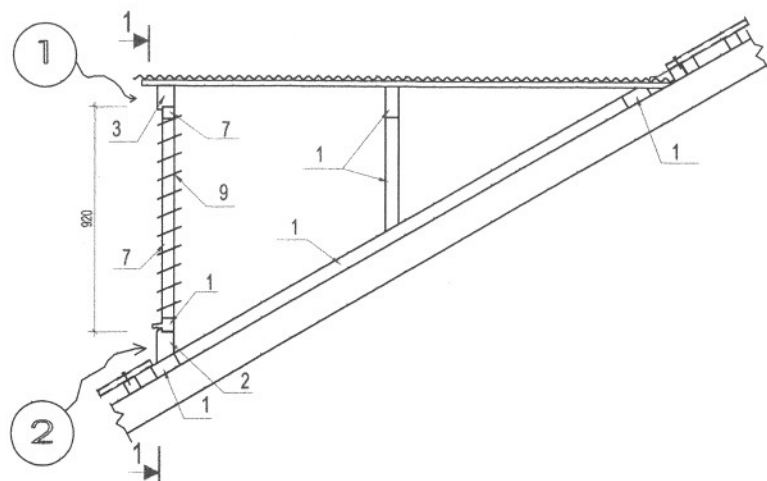

GRIEZUMS 1-1

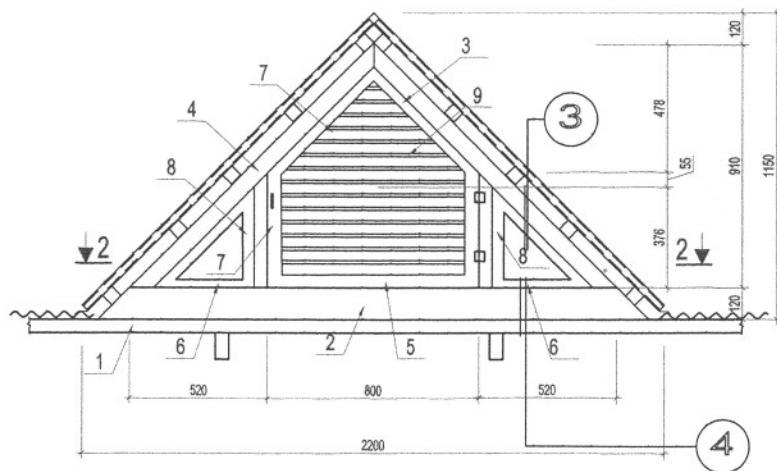

GRIEZUMS 2-2

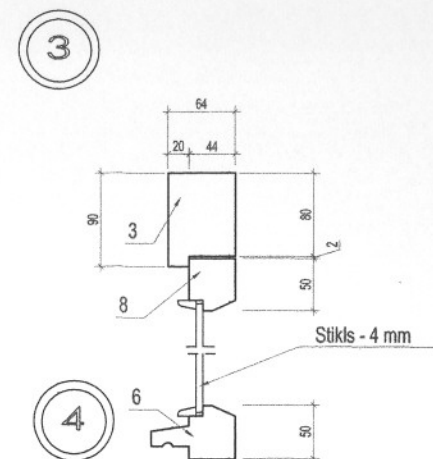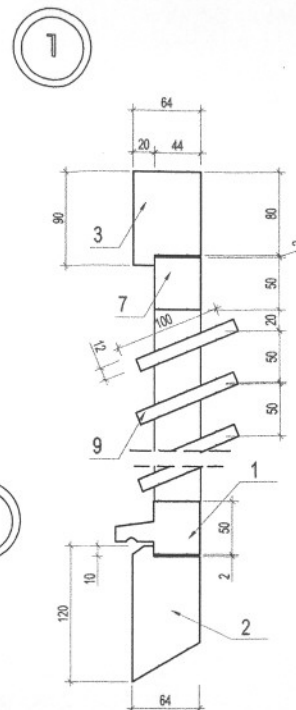

KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAJ MĀJAI SAULES ielā 17, DAUGAVPILĪ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Bēniņu logs BL-1. Griezumi. Mezgli			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		09.2011	Posūtījuma Nr.	11-31-017	Mērogs	Stadija
BŪVTEHNIKE	N.POPKOV		09.2011	Saskopots		1:20,1:5	TP
Arh. reg.Nr.	9650					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-7	

Technical drawing of a stepped profile with the following dimensions:

- Top horizontal segments: 36, 13.9, 22
- Left vertical segments: 12, 14, 5, 9, 10
- Right vertical segment: 50
- Bottom horizontal segments: 10, 10, 16, 44
- Total bottom width: 80
- Internal vertical segment: 10

Technical drawing of a mechanical part with dimensions. The part has a total width of 80 and a total height of 50. The left side features a profile with a top width of 10, a middle width of 10, and a bottom width of 16. The right side is a vertical rectangle with a width of 44. The top edge is divided into segments of 12, 14, 5, and 19. The bottom edge is divided into segments of 10, 10, 16, and 44.

MARKA	POZ.	ŠĶERSGRIEZUMS	GARUMS, m	TILPUMS m ³
BL-1	1	□ 50x100	10.0	0.050
	2	□ 64x120	2.2	0.017
	3	□ 64x90	2.8	0.016
	4	□ 70x70	1.2	0.006
	5	□ 50x80	0.6	0.003
	6	□ 50x80	1.0	0.004
	7	□ 44x50	1.8	0.004
	8	□ 44x50	2.5	0.006
	9	□ 12x100	7.0	0.009
K O P Ā :				0.12

MATERIĀLA NOSAUKUMS	MĒRĒMĪBĀ	SKAITS m
<u>BL-1</u>		
ŠKAUTNI UN DĒĻI	m ³	0.12
ROKTURIS	gab	1
VIRA	gab	2
NAGLAS	kg	10
KOKSKRŪVE	kg	0.06



Daugavpils nodala

BŪVKOMERSANTA

REGISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

ĒKAS FAŠĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA
KARTE DŽĪVOJAMAI MĀJAI SAULES ielā 17, DAUGAVPILĪ.

Amots	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Bēniņu logs BL-1. Poz.2,4,6,8,9. Specifikācija.			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		09.2011	Pasūtījuma Nr.	11-31-017	Mērogs	Stadija
BŪVTEHNIKS	N.POPKOWA		09.2011	Saskopots		1:2,5	TP
Arh. reg.Nr.	9650					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-8	
