

Objekta novietojuma shēma

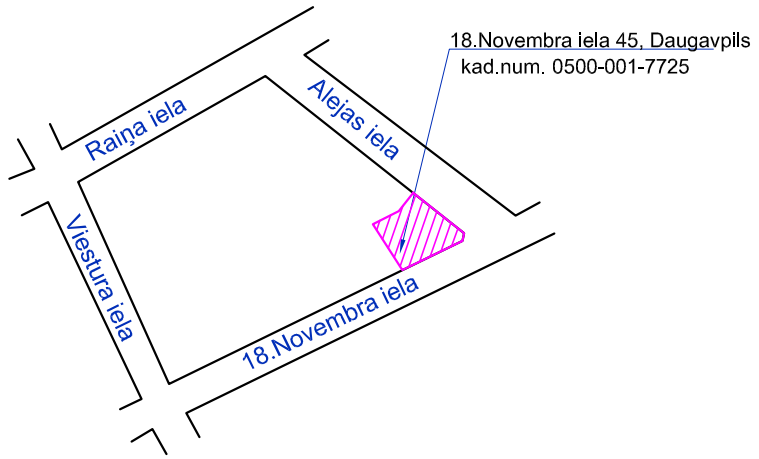

Z

D

SITUĀCIJAS PLĀ NS

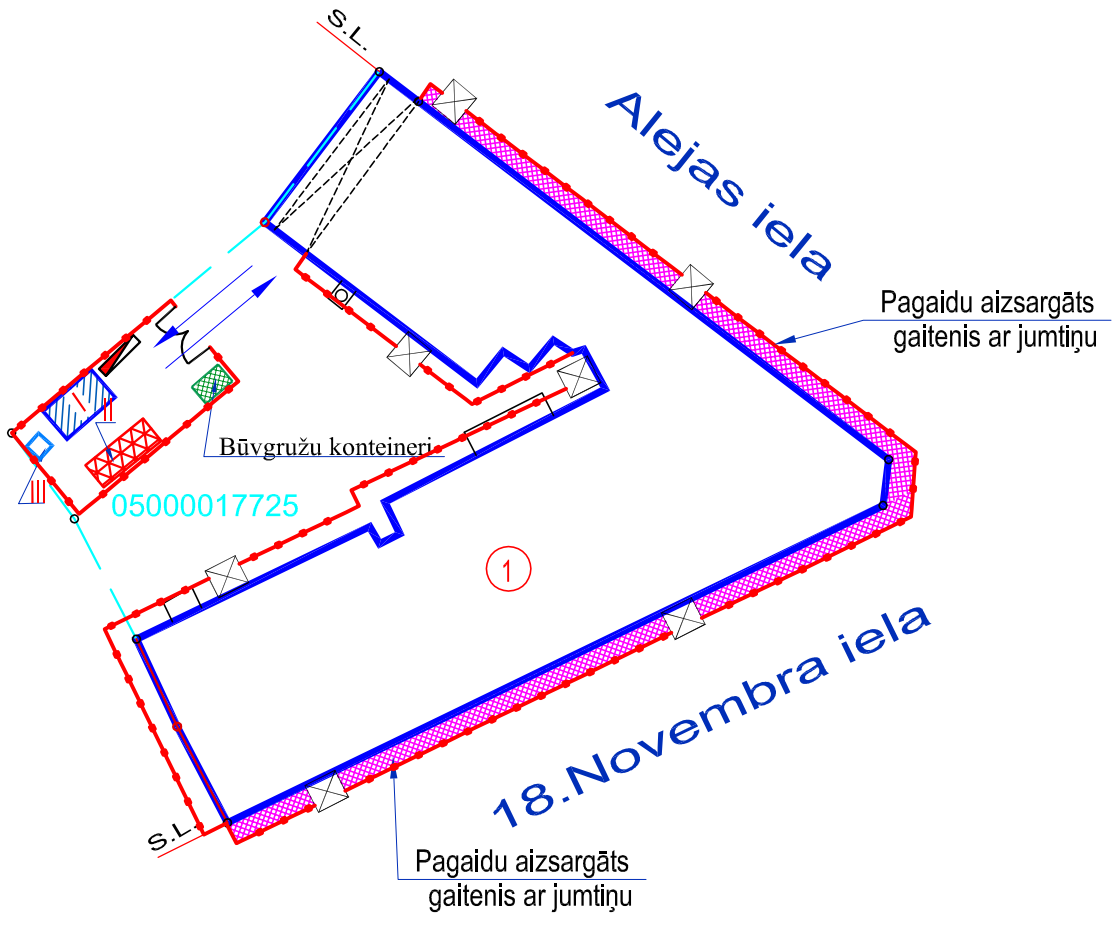

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

plānā	Nosaukums
	Daudzīvokļu dzīvojamā māja
	Pārvietojamu pagaidu vagoniņu uzstādiša-nas vieta (sadzīves telpas, apsardze, darbu vadītājs, medpunkts)
	Būvgružu pagaidu glābšanas konteiners
	Materiālu nokraušanas vieta
	Biotualete
	Būvlaukuma pagaidu nožogojums
	Celtniecības būvlaukuma inventaras nožogojums ar jumtiņu
	Autotransporta kustības virziens

Darbu un materiālu apjomi

Poz.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mēra v - ba	Daudz.	Piezīmes
1	Administrācijas un strādnieku modulis	AxBxH 5.86x2.24x2.34,	m^2	13.10	
2	Ugunsdzēsības inventāra stends		gab.	1	Lāpstas, spaiņi, ķekši, putu aparāti
3	WC (biotualetes)	AxBxH 1.20x1.40x2.34,	gab.	1	
4	Būvgružu konteineri	V=8.5m3-A x B x H 4.09x1.75 x 1.5	gab.	1	
5	Būvlaukuma nožogojums	BEKAERT vai analogi	p/m	220.0	
6	Orientējošs būvniecības atkritumu apjoms		t	28*	

Pagaidu ēku un būvju eksplikācija

Nr p/k	Nosaukums	Mērvedība	Daudz
I	Pārvietojamo pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta	m2	13.10
II	Materiālu nokraušanas vieta	m2	7.18
III	Biotualete	m2	1.68
IV	Pagaidu nožogojums	m	~220.00

Būvmehānismu raksturojums

Nosaukums	Izlices garums m	Izlices attālums m	Izlices pacelš. augstums m	Celtspēja, t	
				uz balsta	bez balsta
Autoceltnis KS3577-3k	14+7	7.5 14	21 16	2.0 0.6	
Autotornis NISSAN "Cabstar"	-	-	-	-	-

Piezīmes:

1. PIRMS BŪVDARBA UZSAKŠANAS UZSTĀDĪT PAGAIDU BŪVLAUKUMA NOŽOGOJUMU.
2. KOKA SPĀRU PACELŠANA JUMTA KONSTRUKCIJU ATJAUNOŠANAI PAREDZĒTA AR AUTOCELTŅI KS-3577.
3. BUVMATERIĀLU PIEGĀDE UZ JUMTU PAREDZĒTA AR AUTOTORŅI VAI CITU PACELŠANAS MEHĀNISMU (ELEKTRISKA/MEHĀNISKA VINČA). AUTOTORŅA/AUTOCELTŅA IZVIETOŠANU UN NOŽOGOŠANU, KĀ ARĪ CITA MEHĀNISMA IERĪKOŠANU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS DVP PROJEKTĀ.
4. KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS LAIKA IEVIEROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS ATBILSTOŠI "MK 2003.25.02 NOT. Nr.92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS".
5. GAR MĀJU 18.NOVEMBRA ielā 45, IETEICAMS VEIDOT GĀJĒJU TUNELI.
6. BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTA BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNU, JA NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM. PAGAIDU CEĻA SATIKSMES ORGANIZĀCIJU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅIEMEJS DVP PROJEKTĀ UN SASKAŅO AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM (JA NEPIECIEŠAMS). BŪVDARBU VEIKŠANAS GAITĀ NEPIEĻAUT BOJĀJUMU NODARĪŠANU TREŠJĀM PERSONĀM UN VIŅU ĪPAŠUMĀM.
7. PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS ATJAUNOT ESOŠO LABIEKĀRTOŠANU.
8. Pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA"Aircom, SIA "Baltcom" pārstāvjus esošos tīklus norādei, kurus nepieciešams saglabāt un aizsargāt. Dz.mājas bēniņos un jumtā SIA "Tet" sakaru tīklu nav. Ir SIA"Tet"" sakaru kanalizācijas ievads pagrabā.

KOMUNALPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA ielā 45, DAUGAVPILĪ, JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

Lapas saturs

Darbu organizēšanas shēma

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums						
BK daļ. vad.	A.Pundurs		06.2023	Pasūtījuma Nr.		23-31-007		Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		06.2023	Pasūtītājs:	SIA "DDzKSU"			1:500	-
Arh. reg.Nr.	9932							Lapas Nr.	Lapu sk.
